



INFORME DE IMPLEMENTACIÓN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y
AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN MACHUPICCHU EXCLUSIVE
TOURS



ENTIDAD SOLICITANTE	MACHUPICCHU EXCLUSIVE TOURS EIRL
RUC	20490799584
CÓDIGO DE PROYECTO	N° 776-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA DE INFORME	15-12-2025 al 05-03-2026

**JESSICA MIRIAN MONGE
RODRIGUEZ**
Coordinador general del proyecto

JOSE RAFAEL DELGADO
Consultor general del proyecto

ROGER INFA SANCHEZ
Co-Consultor del proyecto

CUSCO – PERÚ
2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del proyecto	5
2.1. Situación previa	5
2.2. Problemática identificada	5
3. Objetivos del proyecto	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Alcance de implementación	9
4.1. Alcance temático	9
4.2. Alcance organizacional	10
4.3. Alcance temporal	11
4.4. Cronograma y estado de implementación	11
5. Metodología de implementación	12
5.1. Enfoque metodológico del proyecto	12
5.2. Metodología ágil aplicada (Scrum)	12
5.3. Herramientas de gestión y comunicación	13
5.4. Sprints de configuración	13
6. Situación inicial (pre-implementación)	15
6.1. Diagnóstico de procesos actuales	15
6.2. Brechas identificadas	15
6.3. Mapa de procesos inicial	16
7. Implementación del sistema Odoo	17
7.1. Configuración inicial	17
7.2. Implementación del módulo CRM (gestión turística)	18
7.3. Implementación del módulo de Proyectos (control de itinerarios)	18
7.4. Gestión de cobros y ventas (facturación básica)	19
7.5. Gestión de actividades y alertas	19
7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema	20
7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)	21

8. Resultados de la implementación	24
8.1. Resultados inmediatos de configuración	25
8.2. Resultados preliminares	25
8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)	25
8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa	25
9. Plan de capacitación y gestión del cambio	27
9.1. Objetivo de la gestión del cambio	27
9.2. Metodología de transferencia de conocimientos	27
9.3. Despliegue y retroalimentación	28
9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica	28
10. Conclusiones	29
10.1. Sostenibilidad y escalabilidad del proyecto	29
10.2. Mejora en la eficiencia y competitividad	29
10.3. Fortalecimiento de la seguridad y reputación digital	29
10.4. Trazabilidad y control operativo integral	29
11. Recomendaciones	31
11.1. Disciplina en el registro de información	31
11.2. Certificación en protección de datos y ciberseguridad	31
11.3. Escalabilidad hacia la gestión financiera	31
11.4. Implementación de analítica predictiva e IA	31

1. Introducción

El presente informe de implementación documenta el proceso de adopción, configuración y puesta en marcha del sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo para la empresa Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L.. El objetivo central es digitalizar y optimizar los flujos críticos de gestión comercial y operativa, mejorando la seguridad de la información y la trazabilidad de los servicios ofrecidos.

Machu Picchu Exclusive Tours es una agencia de viajes cusqueña fundada en 2015, especializada en el sector de turismo receptivo de lujo y aventura con más de una década de experiencia; la organización se distingue por ofrecer experiencias auténticas lideradas por guías locales. Actualmente, la empresa opera de manera 100 % virtual, captando clientes exclusivamente extranjeros (principalmente de los mercados norteamericano y europeo) a través de recomendaciones y contactos directos por WhatsApp.

A pesar de su sólida reputación, la empresa enfrenta desafíos operativos derivados de una limitada digitalización. La gestión actual se apoya de forma manual en herramientas como Excel y WhatsApp, lo que provoca una dispersión de información confidencial —incluyendo documentos de identidad y pasaportes de los pasajeros— y dificulta el seguimiento de oportunidades comerciales y la trazabilidad de las reservas.

En este contexto, la implementación de Odoo se plantea como una solución estratégica para centralizar la data operativa, profesionalizar la atención al cliente y ordenar el flujo logístico comercial. Mediante el uso de módulos estándar como CRM y Proyectos, el sistema permitirá obtener una visión 360° del turista, gestionar itinerarios complejos de 2 a 20 días mediante tableros visuales y asegurar el control interno de adelantos y pagos antes de la compra de boletos no reembolsables.

El presente documento describe de manera estructurada las fases del proyecto, orientadas a transformar la gestión manual en un modelo digital inteligente. Este enfoque busca asegurar la autonomía de los datos, establecer reglas de negocio claras y dotar a la gerencia de herramientas analíticas para una toma de decisiones basada en evidencia.

En coherencia con la planificación general del proyecto, este informe se centra en la adopción de funcionalidades estándar de Odoo, evitando desarrollos a medida y priorizando una puesta en marcha ágil y segura. La solución propuesta cubre procesos críticos como la gestión

de relaciones con clientes (CRM turístico), la gestión de itinerarios y reservas mediante el módulo de Proyectos, y el registro manual de adelantos y pagos, todo ello bajo un esquema de operación en la nube.

Asimismo, se establece explícitamente qué aspectos quedan fuera del alcance de esta fase (integraciones automáticas vía API, facturación electrónica completa, portales de autogestión o módulos avanzados de contabilidad e inventarios), de modo que la organización cuente con una visión realista del alcance actual y de las posibles líneas de evolución futura del ecosistema digital.

En síntesis, la introducción sitúa al lector en el punto de partida: una empresa con una oferta turística consolidada, pero con procesos de gestión aún manuales y fragmentados, que decide apoyarse en una plataforma en la nube para ordenar su información, profesionalizar la atención al turista extranjero y disponer de herramientas que permitan medir, con datos, el impacto de sus decisiones comerciales y operativas.

2. Antecedentes del proyecto

2.1. Situación previa

Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. es una agencia de viajes cusqueña fundada en 2015, especializada en el sector de turismo receptivo de lujo y aventura. A pesar de contar con un producto validado y una sólida reputación basada en servicios personalizados guiados por expertos locales, la empresa operaba bajo un modelo de gestión tradicional y limitado en términos digitales.

Hasta antes de la implementación, la gestión operativa y comercial se caracterizaba por:

- **Captación orgánica y manual:** los clientes, mayoritariamente extranjeros de los mercados norteamericano y europeo, contactaban a la empresa principalmente por recomendaciones directas y a través de WhatsApp, medio por el cual se realizaba todo el ciclo de venta.
- **Fragmentación de la información:** no se contaba con un CRM ni una base de datos estructurada. La información de los pasajeros, sus itinerarios (que varían de 2 a 20 días) y sus preferencias se gestionaba de forma dispersa en hojas de Excel, chats de WhatsApp y registros físicos.
- **Gestión de pagos externa:** el registro de adelantos (usualmente del 30 % al 50 %) y saldos se realizaba de manera manual, tras recibir confirmaciones de enlaces de pago externos, lo que dificultaba el control interno inmediato antes de proceder con compras no reembolsables de boletos o trenes.
- **Operación 100 % virtual:** al no contar con una oficina de atención física para ventas, toda la interacción y la generación de confianza dependía de videollamadas y el envío de documentos por medios digitales no centralizados.

2.2. Problemática identificada

El diagnóstico inicial reveló brechas críticas que obstaculizaban la escalabilidad y seguridad del negocio:

- A. **Riesgos en la seguridad de datos:** la recepción de información sensible, como fotografías de pasaportes enviadas por WhatsApp, representaba un riesgo de ciberseguridad y privacidad, además de obligar a una depuración manual periódica para evitar el almacenamiento inseguro en dispositivos personales.
- B. **Falta de trazabilidad comercial:** la dependencia de herramientas aisladas provocaba duplicidad de tareas y pérdida de visibilidad sobre el estado real de las

oportunidades de venta. No existía un historial centralizado que permitiera analizar hábitos de consumo o realizar estrategias de fidelización y remarketing.

- C. **Cuellos de botella en la gestión:** la estructura organizacional es altamente centralizada, donde la gerencia asume múltiples funciones operativas y comerciales. Sin un sistema que automatice recordatorios o el seguimiento de itinerarios, la capacidad de respuesta se veía limitada durante las temporadas de alta demanda.
- D. **Ausencia de inteligencia de negocios:** la falta de indicadores (KPIs) y reportes automatizados impedía a la empresa medir con precisión la eficacia de sus canales de captación o la rentabilidad de sus productos turísticos específicos.

Estas brechas se corresponden con el diagnóstico de madurez digital descrito en el Plan de Implementación, donde la empresa se ubica en un nivel inicial, con procesos manuales, una gestión comercial no estructurada y una presencia digital débil. La inexistencia de un CRM integrado, la ausencia de analítica de datos y la falta de competencias digitales en el equipo limitan directamente la capacidad de Machu Picchu Exclusive Tours para competir con operadores que ya han avanzado en su transformación digital y que utilizan embudos de conversión, campañas segmentadas y reportes automatizados para la toma de decisiones.

En este contexto, el proyecto de implementación de Odoo se concibe como una respuesta focalizada a dichas brechas, priorizando la centralización de la información, la estructuración del ciclo comercial y la creación de una base sobre la cual se puedan desarrollar, en fases posteriores, iniciativas complementarias de marketing digital, inteligencia de negocios e integración omnicanal.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

De acuerdo con el Plan de Implementación aprobado, el objetivo principal es establecer la hoja de ruta estratégica y operativa para la adopción de herramientas digitales que fortalezcan la gestión comercial, la fidelización de clientes y la presencia internacional de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. El proyecto se centra en la implementación de un CRM integral en la nube y en la ejecución de una estrategia de marketing digital multicanal que permita digitalizar la gestión de clientes, mejorar el seguimiento postventa y aumentar la captación en los mercados internacionales (norteamericano y europeo).

En el marco de este informe, dicho objetivo se materializa mediante la implementación de Odoo como plataforma central (CRM y módulos asociados) sobre la cual se articula el ecosistema digital de la empresa.

Este objetivo general reconoce que la problemática de fondo no se limita a la ausencia de una herramienta tecnológica, sino a la necesidad de redefinir la forma en que se gestionan las relaciones con los turistas, se ordena la información clave del negocio y se aprovechan los canales digitales disponibles. Por ello, la hoja de ruta contempla tanto componentes tecnológicos (plataforma en la nube, parametrización de módulos, indicadores) como organizacionales (capacitación, gestión del cambio, disciplina en el registro de datos), buscando un equilibrio entre la adopción de software y la evolución de las prácticas internas de trabajo.

3.2. Objetivos específicos

- a. **Implementar un CRM integral en la nube:** desplegar y poner en operación una plataforma CRM basada en Odoo que centralice la base de datos de clientes y el seguimiento de oportunidades comerciales, reemplazando la gestión dispersa en Excel, WhatsApp y registros físicos.
- b. **Digitalizar y automatizar el ciclo comercial:** integrar el CRM con los principales canales digitales (sitio web, redes sociales y WhatsApp Business) y habilitar campañas de marketing digital segmentadas que potencien la captación y fidelización de clientes internacionales.
- c. **Fortalecer la inteligencia de negocios:** definir y configurar indicadores clave de desempeño (KPIs) y tableros de control que permitan medir ventas, recurrencia

de clientes, tiempos de respuesta y efectividad de las campañas digitales.

- d. **Desarrollar capacidades digitales del equipo:** ejecutar un plan de capacitación y gestión del cambio que asegure la adopción sostenible del CRM y de las herramientas de marketing digital por parte de la gerencia y el personal operativo.
- e. **Mejorar la competitividad y eficiencia operativa:** lograr, en el periodo de seguimiento establecido en el Plan de Implementación, incrementos en las ventas digitales y reducciones en los tiempos de respuesta y errores administrativos, alineados con las metas cuantitativas definidas en dicho plan.

En conjunto, estos objetivos específicos describen un cambio integral en la forma de operar de Machu Picchu Exclusive Tours: desde la captación y registro de leads internacionales, pasando por el seguimiento estructurado de oportunidades y la ejecución de servicios turísticos complejos, hasta la medición de resultados mediante indicadores de desempeño. No se trata solo de implementar una herramienta, sino de construir las capacidades necesarias para sostener en el tiempo una gestión comercial más profesional, basada en datos y orientada a la experiencia del cliente.

4. Alcance de implementación

El proyecto contempla la implementación y parametrización de la plataforma Odoo Online (SaaS), seleccionada por su capacidad para centralizar operaciones en la nube sin requerir infraestructura local. El alcance se centra en funcionalidades estándar para asegurar una adopción ágil y segura de los siguientes componentes.

4.1. Alcance temático

Se han seleccionado estratégicamente los módulos que cubrirán la operatividad crítica de Machu Picchu Exclusive Tours:

- a. **CRM turístico (gestión de clientes):** centralización de la base de datos de pasajeros (PAX). Este módulo es fundamental para el almacenamiento seguro de documentos de identidad (pasaportes), eliminando el riesgo de seguridad que supone gestionarlos por WhatsApp. Incluye el seguimiento de oportunidades mediante un embudo de ventas (pipeline) y la segmentación básica con etiquetas.
- b. **Módulo de Proyectos (control operativo):** configuración de un tablero visual (Kanban) para el seguimiento de la prestación del servicio. El flujo se adaptará a etapas como: Borrador de Cotización, Confirmación (Adelanto), Compra de Tickets/Hoteles y Ejecución final, permitiendo controlar itinerarios que varían de 2 a 20 días.
- c. **Gestión de cobros y saldos (facturación básica):** uso del módulo estándar para el registro manual de adelantos (30 % a 50 %) y saldos que el cliente paga a través de enlaces externos (Ip-App). Esto permitirá visualizar el estado de pago (Pagado/Pendiente) para habilitar la compra de boletos no reembolsables con seguridad.
- d. **Gestión de actividades:** uso de recordatorios y alertas manuales (llamadas, correos) para el seguimiento post-cotización y la atención personalizada que caracteriza a la empresa.

Este alcance temático se encuentra alineado con el documento de Alcance del Proyecto, en el que se explicita que la implementación se LIMITA a las funcionalidades estándar de Odoo para CRM turístico, control de proyectos, actividades básicas y facturación simple, dejando fuera integraciones automáticas con portales de proveedores, módulos contables avanzados, e-commerce o desarrollo de reportes de inteligencia de negocios fuera de las vistas estándar. De este modo, se garantiza una implementación acotada, realista y coherente con el presupuesto y el horizonte temporal definidos.

Al delimitar con precisión qué procesos quedan cubiertos y cuáles deberán abordarse en etapas posteriores, el alcance temático permite que la empresa enfoque sus esfuerzos en resolver primero los problemas más críticos: la dispersión de la información de clientes, la falta de trazabilidad de itinerarios y la ausencia de un control básico sobre adelantos y saldos. A partir de esta base, será posible evaluar, en futuras fases, la incorporación de funcionalidades más avanzadas sin comprometer la estabilidad de la operación actual.

4.2. Alcance organizacional

La implementación impacta transversalmente en la estructura vertical de la empresa:

- a. **Gerencia General:** acceso a tableros de control (dashboards) con métricas en tiempo real sobre ventas y nacionalidades.
- b. **Ventas y Marketing:** digitalización del proceso de cotización y seguimiento sistemático de leads.
- c. **Operaciones y Reservas:** gestión eficiente de itinerarios y almacenamiento centralizado de vouchers y reservas.
- d. **Administración:** centralización de documentos y control de la eficiencia operativa.

El sistema será utilizado inicialmente por la gerencia y el personal operativo clave (como el apoyo familiar mencionado en las sesiones), definiendo roles de Administrador y Usuario de Ventas.

Adicionalmente, el documento de Alcance contempla componentes transversales como la migración inicial de datos (importación de la base de clientes y contactos, registro de datos maestros de servicios turísticos y configuración de usuarios y permisos) y la parametrización detallada de los flujos comerciales y operativos (etapas del embudo de ventas y del tablero de reservas). Estos elementos forman parte del trabajo de implementación descrito en las secciones posteriores de este informe.

Con ello, el alcance no solo define qué módulos se configuran, sino también cómo se preparan las condiciones organizacionales y de datos para que la herramienta sea útil desde el primer día: quiénes la usarán, qué información mínima debe estar cargada y qué tipo de vistas y etapas se habilitan para reflejar la realidad operativa de la agencia de viajes.

4.3. Alcance temporal

El proyecto se ejecuta de manera progresiva siguiendo un cronograma de fases (sprints).

4.4. Cronograma y estado de implementación

El proyecto se ejecutará bajo una metodología ágil para asegurar que, al no ser un desarrollo desde cero sino una configuración y adaptación de flujos, la puesta en marcha sea rápida y eficiente. A continuación se presenta el cronograma de fases:

Fase	Actividad clave	Enfoque en Odoo
Fase 1	Cimientos del sistema	Levantamiento de procesos y configuración técnica inicial de la instancia de Odoo en la nube.
Fase 2	Migración de datos	Limpieza e importación de la base de datos histórica de clientes y catálogo de servicios turísticos.
Fase 3	Configuración CRM y Proyectos	Parametrización de las etapas del embudo de ventas y los tableros Kanban para itinerarios.
Fase 4	Automatización operativa	Configuración de plantillas de correo, mensajes de WhatsApp y registro de pagos manuales.
Fase 5	Capacitación intensiva	Entrenamiento funcional del personal en el uso integral del sistema.
Fase 6	Acompañamiento y cierre	Marcha blanca, ajustes finales en reportes y entrega del informe de cierre.

Cuadro 1: Cronograma y estado de implementación del proyecto

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque metodológico del proyecto

La implementación del sistema de gestión en la nube para Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. se rige bajo un enfoque de transformación digital ágil, orientado a centralizar la data operativa y profesionalizar la atención al cliente internacional. Al tratarse de una solución basada en las funcionalidades estándar de Odoo Online (SaaS), el proyecto no requiere desarrollos de código a medida, lo que asegura una adopción inmediata, segura y de bajo riesgo técnico.

El enfoque principal es la transición del modelo manual (basado en Excel y WhatsApp) hacia un modelo digital inteligente, priorizando la seguridad de los documentos de identidad de los pasajeros y la trazabilidad de los itinerarios de viaje.

De acuerdo con el Plan de Implementación, este enfoque ágil se articula en fases claramente diferenciadas que van desde el diagnóstico y la planificación estratégica, pasando por la configuración del CRM y la integración de canales digitales, hasta la capacitación y el monitoreo de indicadores. Cada fase tiene objetivos, actividades y entregables definidos, lo que permite a la gerencia contar con visibilidad sobre el avance y tomar decisiones oportunas en caso de requerir ajustes.

5.2. Metodología ágil aplicada (Scrum)

Se adopta la metodología Scrum adaptada al entorno operativo del sector turístico, lo que permite una ejecución por fases con validaciones continuas y mejora progresiva. Esta metodología facilita que el sistema se adapte de forma precisa a los flujos de la empresa mediante ciclos cortos de configuración y retroalimentación.

Las principales características de Scrum aplicadas al proyecto Machu Picchu Exclusive Tours son:

- A. **Entregas parciales por módulos:** se presentó primero la configuración de CRM y leads.
- b. **Retroalimentación continua (feedback):** ajuste inmediato de la interfaz tras la validación del cliente.
- c. **Flexibilidad en el alcance:** incorporación de nuevos requisitos funcionales externos al alcance.

Estos principios se reflejan en la forma en que se organizan los sprints: primero se valida la configuración mínima viable del CRM (registro de contactos, oportunidades y actividades), luego se incorporan gradualmente funcionalidades de proyectos y facturación básica, y finalmente se consolidan las prácticas de uso mediante capacitación y acompañamiento. La retroalimentación constante con la gerencia asegura que las configuraciones se mantengan alineadas con los procesos reales de captación, reserva y postventa descritos en el Plan.

Cada iteración incluye actividades de revisión de procesos, ajustes en las vistas y etapas de los embudos y, cuando corresponde, pequeñas mejoras en la forma de registrar y consultar la información. De esta manera, el sistema no se impone como un esquema rígido, sino que se va ajustando progresivamente a la forma real de trabajar de Machu Picchu Exclusive Tours, siempre dentro de los límites de las funcionalidades estándar de la plataforma.

5.3. Herramientas de gestión y comunicación

Para asegurar el cumplimiento de los hitos y mantener una documentación transparente, se utilizan las siguientes herramientas:

- a. **Trello / Asana:** para el control visual de las tareas y el seguimiento semanal de los sprints.
- b. **Odoo Online:** instancia principal donde se realiza la parametrización de los módulos de CRM y Proyectos.
- c. **Canales de comunicación:** WhatsApp grupal del proyecto para coordinaciones inmediatas y reuniones de control semanales vía videollamada.

5.4. Sprints de configuración

A diferencia de un desarrollo tradicional, la metodología se centra en la configuración y adaptación de flujos. El trabajo se organiza en entregas parciales que permiten a la gerencia validar la usabilidad del CRM y el tablero de proyectos antes del despliegue final, asegurando que la herramienta responda a la realidad de tours que varían entre 2 a 20 días.

Esta organización por sprints facilita también la gestión de riesgos: posibles incidencias técnicas, dudas del equipo o necesidades de ajuste se detectan tempranamente y se abordan dentro del siguiente ciclo de trabajo, evitando acumulación de problemas

al final del proyecto. Al concluir los sprints previstos, la empresa no solo dispone de una herramienta parametrizada, sino también de un equipo que ha participado activamente en su configuración y que, por tanto, está mejor preparado para utilizarla en la operación diaria.

6. Situación inicial (pre-implementación)

6.1. Diagnóstico de procesos actuales

Antes de la implementación de Odoo, Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. operaba bajo un modelo de gestión tradicional, caracterizado por procesos manuales y una limitada digitalización de sus operaciones comerciales y administrativas. La empresa, aunque consolidada en el sector de lujo y aventura, dependía de herramientas aisladas para su funcionamiento diario.

El diagnóstico de los procesos actuales revela los siguientes puntos críticos:

- a. **Captación y venta informal:** el 100 % de los clientes son extranjeros y la captación se realiza de manera orgánica mediante recomendaciones, tarjetas personales y eventos. El canal principal de comunicación y cierre de ventas es WhatsApp, donde se definen itinerarios que varían de 2 a 20 días según el presupuesto y preferencias del turista.
- b. **Gestión documental de riesgo:** la información sensible de los pasajeros, específicamente las fotografías de pasaportes, se recibe y almacena directamente en dispositivos personales a través de WhatsApp. Por seguridad, la gerencia borra estas fotos periódicamente, lo que impide contar con una base de datos histórica y estructurada de los clientes.
- c. **Flujo de pagos externo:** la gestión de cobros se realiza mediante enlaces de pago externos (Ip-App). El registro de adelantos (30 % al 50 %) y saldos pendientes se lleva de forma manual, lo que dificulta la trazabilidad inmediata necesaria antes de comprar boletos o trenes no reembolsables.
- d. **Administración centralizada y manual:** la estructura es altamente vertical; la gerencia asume desde la captación hasta la coordinación operativa, apoyándose en Excel y registros físicos. Los reportes de satisfacción se solicitan de forma externa mediante encuestas de Google o TripAdvisor al finalizar el viaje.

6.2. Brechas identificadas

El análisis técnico detectó brechas significativas que limitan la escalabilidad y seguridad de la organización:

- a. **Vulnerabilidad en la seguridad de datos:** la falta de un repositorio seguro para documentos confidenciales (pasaportes) y la ausencia de políticas de ciberseguridad o respaldos automáticos representan un riesgo crítico de pérdida de información sensible.

- b. **Falta de trazabilidad comercial:** al no contar con un CRM, existe una total desconexión en el seguimiento de prospectos. La dependencia de chats individuales de WhatsApp provoca pérdida de información y dificulta las estrategias de fidelización o remarketing.
- c. **Carga operativa y cuellos de botella:** la gestión manual genera duplicidad de tareas, errores en el registro de reservas y una lenta capacidad de respuesta, especialmente en temporadas de alta demanda.
- d. **Ausencia de inteligencia de negocios (BI):** no se analizan datos de ventas, nacionalidades con mayor demanda o rentabilidad por tipo de tour, lo que impide tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia.

Estas observaciones coinciden con el análisis de brechas del Plan de Implementación, donde se señala que la empresa se encuentra en un nivel de madurez digital incipiente: sin registro sistemático de clientes, con presencia digital pasiva y sin herramientas analíticas que soporten decisiones estratégicas. La combinación de procesos manuales, dispersión de datos y falta de formación en herramientas digitales genera un riesgo directo de estancamiento frente a competidores que ya operan con CRM, campañas segmentadas y reportes automatizados.

6.3. Mapa de procesos inicial

El flujo operativo previo a la intervención tecnológica se describe como fragmentado. Se inicia con una consulta por WhatsApp, seguida de la elaboración manual de itinerarios en Excel y el envío de cotizaciones informales. La confirmación depende de la verificación manual del abono bancario, y el seguimiento operativo se realiza sin un tablero visual, dependiendo exclusivamente de la memoria y la coordinación directa de la gerencia con los guías y transportistas.

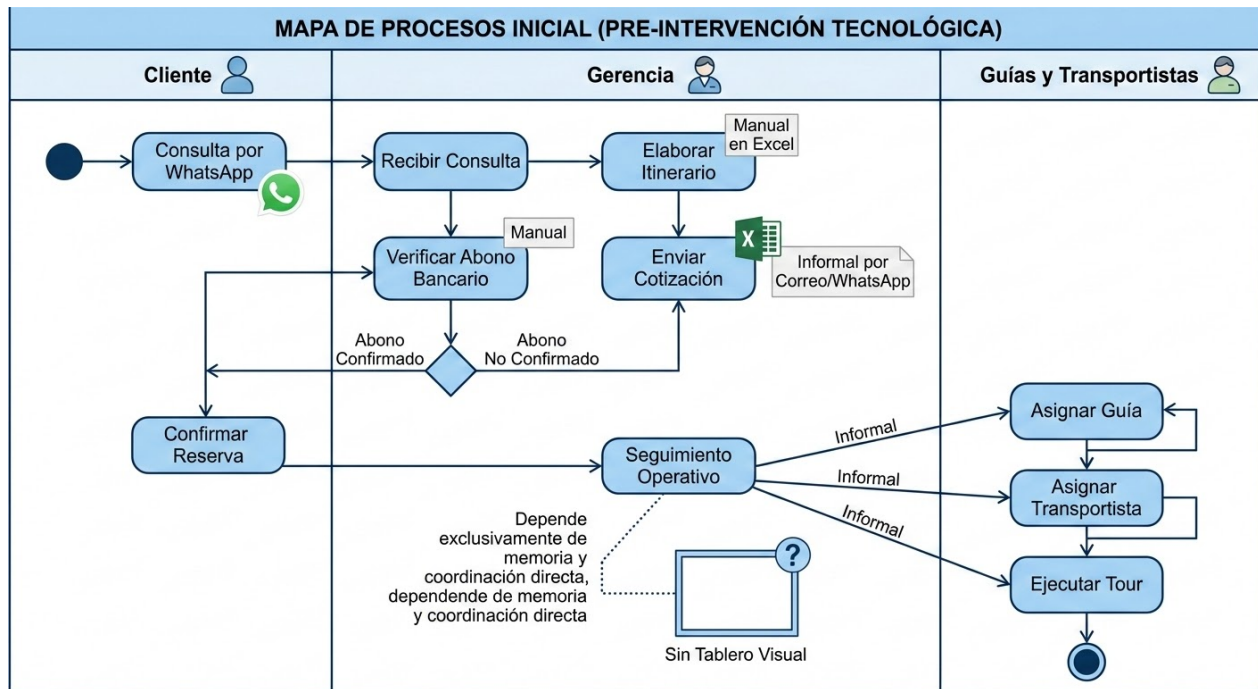


Figura 1: Mapa de procesos inicial de Machu Picchu Exclusive Tours

7. Implementación del sistema Odoo

7.1. Configuración inicial

La implementación de la plataforma para Machu Picchu Exclusive Tours se realiza bajo la modalidad Odoo Online (SaaS), lo que permite desplegar una solución centralizada en la nube accesible desde cualquier ubicación. En esta etapa se procedió a la creación del entorno de trabajo, definiendo la base de datos principal, la configuración de moneda (USD y PEN), idioma y zona horaria. Se activaron los módulos de CRM, Proyectos y Ventas, asegurando que el entorno esté preparado para la parametrización de los procesos operativos de la agencia.

Esta configuración inicial se enmarca dentro del alcance definido para la parametrización y configuración del sistema: se establecieron las etapas del flujo comercial (embudo de ventas) y del tablero de reservas, se revisaron las vistas estándar proporcionadas por Odoo y se preparó la estructura necesaria para la posterior carga inicial de datos maestros (clientes y catálogo de servicios turísticos), tal como se detalla en el documento de Alcance del Proyecto.

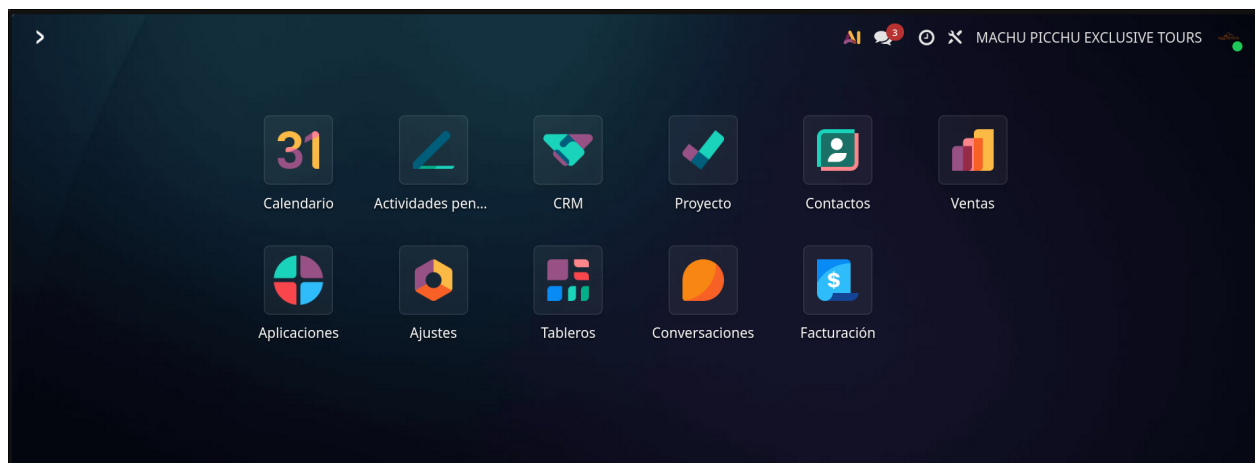


Figura 2: Configuración inicial de la instancia Odoo Online

7.2. Implementación del módulo CRM (gestión turística)

El CRM es el núcleo para la centralización de la base de datos de pasajeros (PAX), reemplazando el uso de Excel y WhatsApp. Las acciones clave incluyen:

- a. **Almacenamiento seguro de pasaportes:** se habilitó el repositorio estándar para la carga manual y almacenamiento seguro de fotografías de pasaportes y documentos de identidad directamente en la ficha del cliente. Esto elimina el riesgo de seguridad de gestionar datos sensibles en dispositivos personales.
- b. **Embudo de ventas (pipeline):** configuración de un embudo con etapas estándar para el seguimiento de oportunidades comerciales, permitiendo una visión 360° del turista extranjero antes de la confirmación del viaje.
- c. **Gestión de interacciones:** registro de notas e historial de comunicaciones para profesionalizar el seguimiento post-cotización.

7.3. Implementación del módulo de Proyectos (control de itinerarios)

Dado que la empresa gestiona itinerarios complejos que varían de 2 a 20 días, se configuró este módulo como herramienta de control operativo:

- a. **Tablero visual Kanban:** los servicios se visualizan en un tablero con etapas adaptadas: Borrador de Cotización, Confirmación (Adelanto), Compra de Tickets/Hoteles y Ejecución Final.
- b. **Documentación centralizada:** carga manual de boletos de tren, avión y entradas a Machu Picchu como adjuntos en cada tarea, asegurando que toda la evidencia del viaje sea real y accesible.

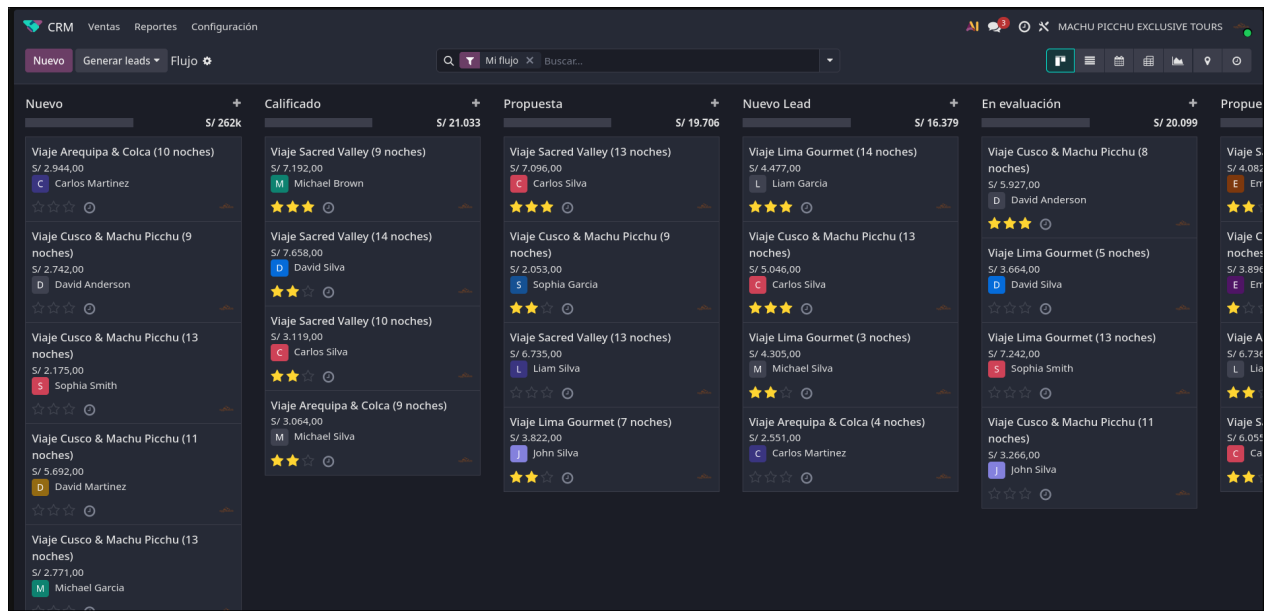


Figura 3: Vista del pipeline de CRM turístico en Odoo

- c. **Asignación de responsables:** permite definir usuarios encargados para el seguimiento de cada reserva, mejorando la coordinación interna.

7.4. Gestión de cobros y ventas (facturación básica)

Se parametrizó el flujo de ventas para gestionar los pagos parciales característicos de la agencia:

- a. **Registro de adelantos y saldos:** configuración para el registro manual de abonos (usualmente del 30 % al 50 %) cobrados mediante enlaces externos como Ip-App.
- b. **Control de saldos pendientes:** el sistema permite visualizar rápidamente si un pasajero tiene saldos por pagar, lo cual es un paso crítico antes de proceder con la compra de boletos no reembolsables.
- c. **Confirmaciones automáticas:** generación de recibos internos con el formato estándar de Odoo para enviar la confirmación de recepción de fondos al turista.

7.5. Gestión de actividades y alertas

Se implementó la funcionalidad de *Actividades* para programar recordatorios manuales de llamadas, correos de seguimiento o tareas de post-venta. Estas actividades son visibles en una vista de calendario nativa, facilitando que la gerencia mantenga el contacto

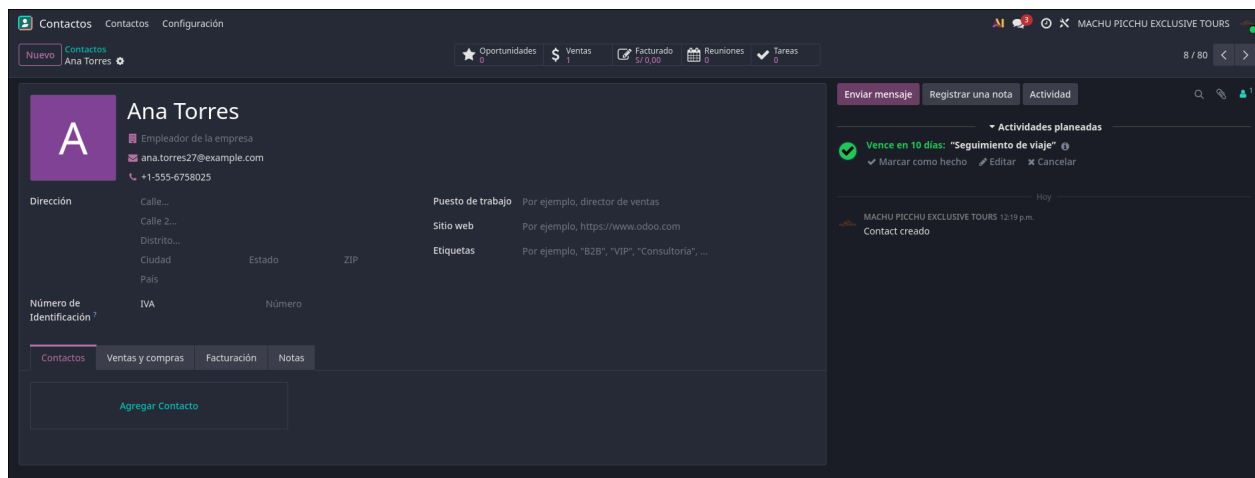


Figura 4: Detalle de la ficha del cliente (PAX) con datos y documentos adjuntos

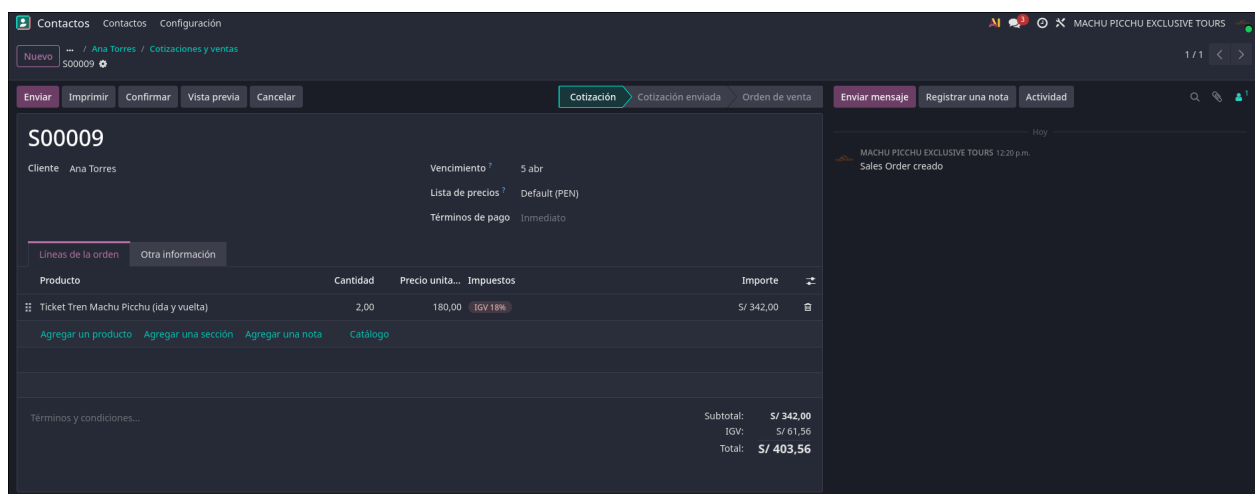


Figura 5: Ejemplo de cotización generada desde el CRM

personalizado con los clientes (por ejemplo, saludos de cumpleaños o tarjetas de fin de año).

7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema

La principal fortaleza de esta implementación radica en la interconexión: una oportunidad ganada en el CRM activa automáticamente el seguimiento en el tablero de Proyectos. Esta trazabilidad garantiza que los datos del pasaporte registrados inicialmente se utilicen correctamente en la compra de entradas a Machu Picchu, donde los errores de digitación pueden impedir el ingreso de los turistas debido a las estrictas regulaciones.

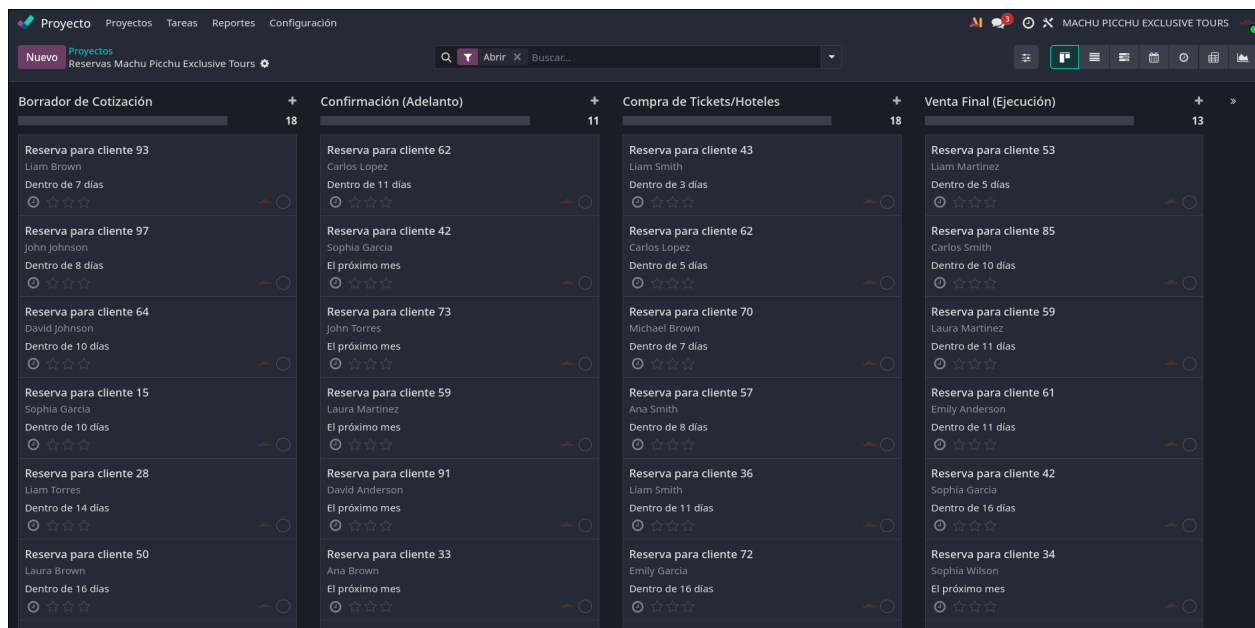


Figura 6: Tablero Kanban de proyectos para control de itinerarios

Gracias a esta integración, la información deja de viajar de manera aislada entre hojas de cálculo, correos y mensajes de chat, y pasa a fluir de forma ordenada dentro de la plataforma: un contacto registrado en el CRM puede convertirse en oportunidad, luego en reserva dentro de un proyecto y, finalmente, en una operación cerrada con sus respectivos documentos adjuntos. Este encadenamiento de etapas refleja el ciclo comercial y operativo descrito para la agencia y constituye uno de los principales aportes de la implementación de Odoo en este contexto.

7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)

A continuación se describe el flujo operativo resultante tras la implementación de Odoo, que reemplaza el proceso fragmentado descrito en la sección de situación inicial:

Captación y primer contacto. El cliente extranjero llega por recomendación, WhatsApp o redes sociales. El contacto se registra en el CRM como lead o contacto; si hay consulta concreta, se crea una oportunidad y se asigna una etapa en el embudo de ventas.

Cotización. Desde el CRM se trabaja la oportunidad: se revisa la ficha del cliente (datos, pasaporte si ya fue enviado), se arma el itinerario y se genera la cotización formal desde Odoo. La propuesta comercial queda vinculada al contacto y a la oportunidad.

Confirmación y adelanto. Cuando el cliente acepta, la oportunidad pasa a estado ganada y en el módulo de Proyectos se crea el proyecto o tarea del tour. Se registra en Ventas el adelanto (30 % a 50 %) que el cliente paga mediante enlace externo (Ip-App).

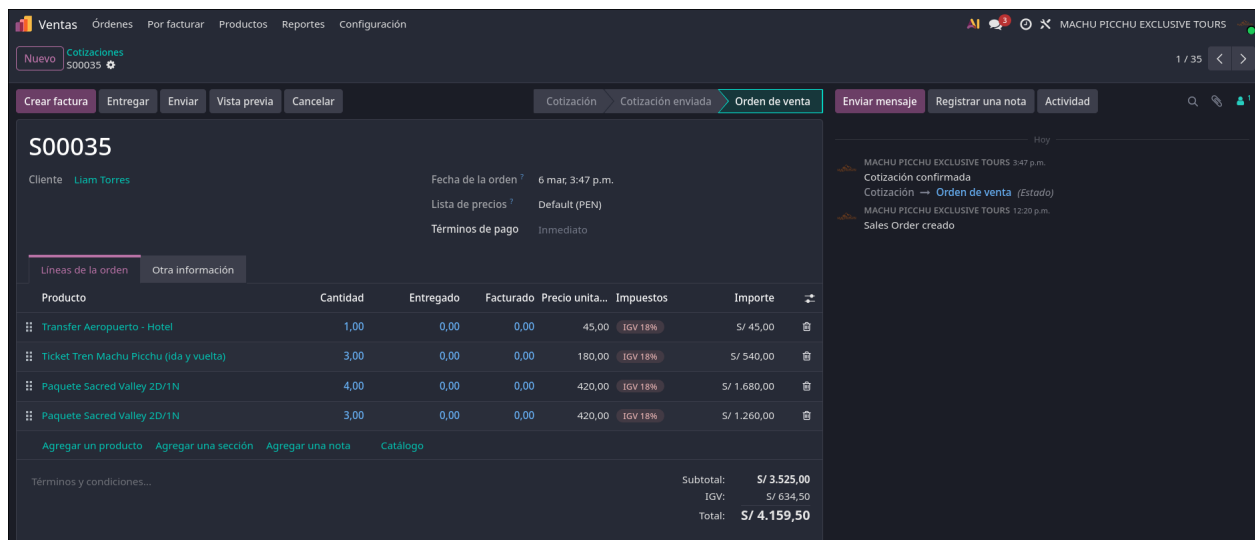


Figura 7: Gestión de cobros y pagos parciales en Odoo

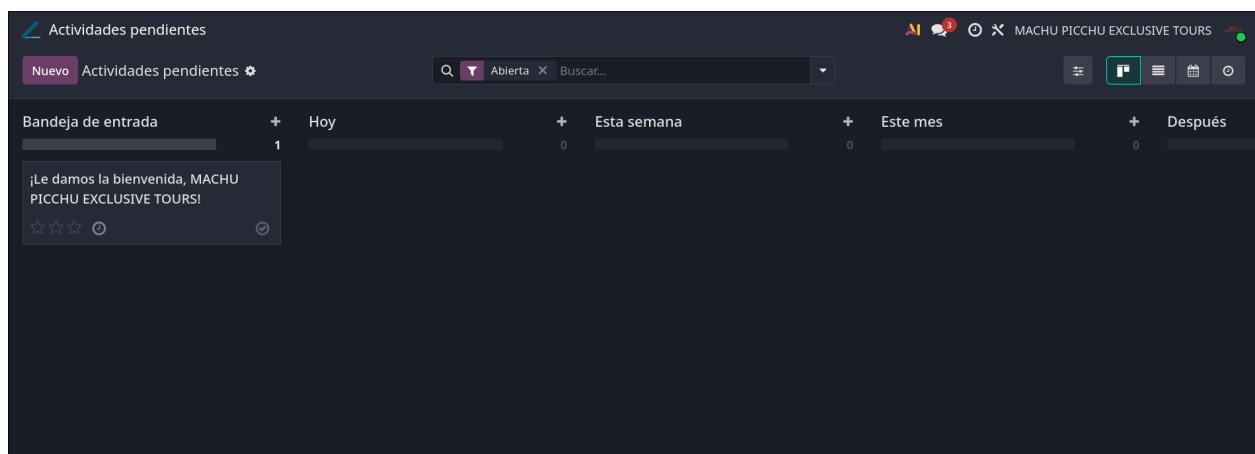


Figura 8: Gestión de actividades y recordatorios en Odoo

El sistema muestra el estado Pagado o Saldo pendiente.

Compra de tickets y servicios. Con el adelanto registrado, en el tablero Kanban la reserva avanza a la etapa de compra de tickets y hoteles. Se utilizan los datos del pasaporte ya cargados en la ficha del cliente para comprar entradas, tren, etc. Los comprobantes se adjuntan a la tarea.

Ejecución del tour. La reserva pasa a la etapa de ejecución final. Toda la documentación (vouchers, boletos, entradas) permanece centralizada en la tarea. Los recordatorios y actividades de seguimiento se gestionan desde el CRM y se visualizan en el calendario de actividades.

Cierre y seguimiento. Al finalizar el viaje, la operación se cierra en el tablero. La ficha del cliente en el CRM conserva el historial completo para futuras reservas o acciones de

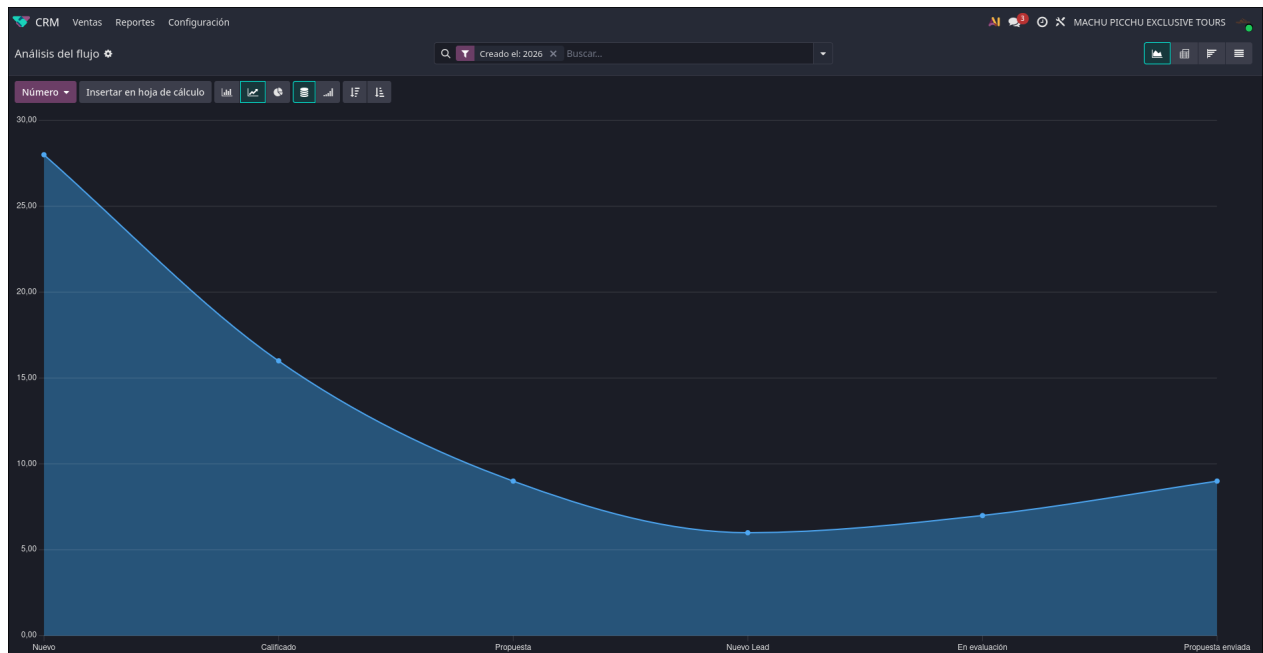


Figura 9: Trazabilidad entre CRM y Proyectos dentro de Odoo

fidelización.

En síntesis, el flujo pasa de ser disperso (Excel, WhatsApp, memoria) a estar centralizado en Odoo, con trazabilidad entre CRM y Proyectos y sin depender de registros paralelos para el control oficial de la operación.

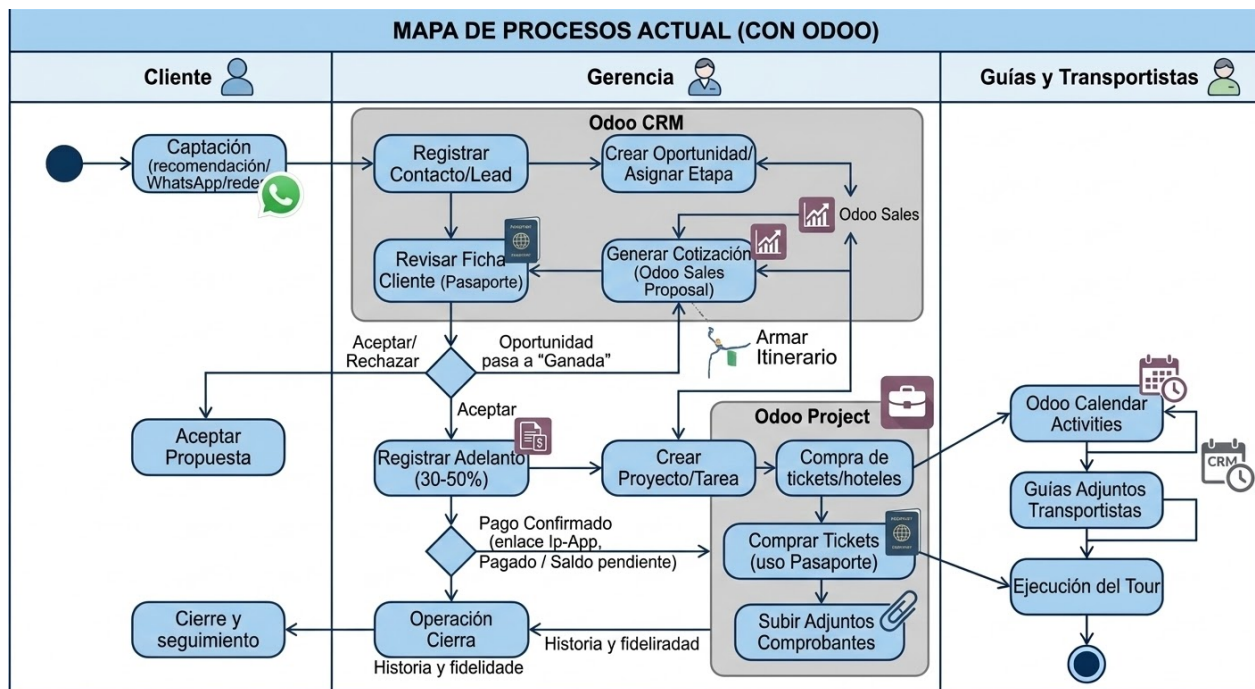


Figura 10: Mapa de procesos actual de Machu Picchu Exclusive Tours con Odoo

8. Resultados de la implementación

A la fecha de elaboración de este informe, el proyecto se encuentra en la fase de cierre de implementación y marcha blanca de la plataforma Odoo. Esto significa que los módulos configurados ya están disponibles para uso operativo, pero aún no se cuenta con una base de datos histórica suficiente como para acreditar cambios consolidados en los indicadores de negocio. En consecuencia, los resultados presentados en esta sección son principalmente cualitativos y se enfocan en los logros de configuración y en las metas de desempeño que se han definido para la etapa posterior de operación.

Esta situación es coherente con el cronograma del proyecto, en el que la etapa de monitoreo, evaluación y ajustes finales se programa luego de la puesta en marcha del CRM y de las herramientas digitales asociadas. Por ello, el foco de este informe está en documentar el estado de la plataforma al cierre de la implementación, describir los avances concretos en términos de parametrización y preparación de datos, y dejar claramente establecidos los indicadores que se utilizarán para medir el impacto en los meses siguientes.

8.1. Resultados inmediatos de configuración

Entre los principales resultados alcanzados al término de la etapa de implementación se encuentran:

- a. **Instancia Odoo operativa:** despliegue de la instancia Odoo Online con los módulos de CRM, Proyectos y Ventas habilitados para Machu Picchu Exclusive Tours.
- b. **Flujos de registro y seguimiento configurados:** parametrización de los flujos para el registro de clientes, el seguimiento de oportunidades, el control de itinerarios (mediante tableros Kanban) y el registro manual de pagos parciales.
- c. **Estructura de datos y seguridad:** definición de campos clave para el sector turístico (pasaportes, nacionalidad, duración del tour, etc.) y configuración de perfiles de usuario y permisos de acceso acordes a los roles definidos en el proyecto.
- d. **Actividades y alertas:** habilitación de actividades y recordatorios dentro del CRM para apoyar el seguimiento post-cotización y las acciones de fidelización.

Estos elementos sientan las bases para que, en la fase de operación y monitoreo, se puedan medir de manera objetiva los impactos comerciales y operativos previstos.

8.2. Resultados preliminares

Durante la marcha blanca se han observado cambios iniciales en la forma de trabajo de la gerencia y del personal involucrado, principalmente relacionados con el uso de una ficha única de cliente y la visualización de los servicios en tableros Kanban. Sin embargo, estos cambios aún se encuentran en consolidación y no es posible, en esta etapa, atribuir mejoras cuantitativas directas en ventas, tiempos de respuesta o reducción de errores administrativos.

Los resultados cuantitativos se evaluarán en la etapa de monitoreo y ajustes finales, conforme al cronograma definido en el Plan de Implementación.

8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)

En coherencia con el Plan de Implementación, se han definido los siguientes indicadores clave de desempeño y sus metas esperadas. Estos KPIs constituyen la base para el seguimiento posterior a la implementación, más que resultados ya alcanzados:

8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa

De acuerdo con las metas cuantitativas establecidas en el Plan de Implementación, se espera que, una vez consolidada la adopción de Odoo, la empresa logre reducciones

significativas en la carga administrativa de la gerencia y en los errores derivados de la gestión manual, así como un incremento en las reservas digitales directas. La verificación de estas proyecciones requerirá un periodo adicional de operación y monitoreo, por lo que los resultados descritos en este informe deben entenderse como expectativas fundadas y no como logros ya comprobados.

9. Plan de capacitación y gestión del cambio

9.1. Objetivo de la gestión del cambio

La estrategia de capacitación tiene como propósito facilitar la transición tecnológica de Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. desde una gestión manual basada en WhatsApp y Excel hacia un entorno digital centralizado en Odoo. Se busca reducir la brecha de aprendizaje de la gerencia y el personal operativo (incluyendo el apoyo familiar mencionado), asegurando que el sistema sea percibido como una herramienta que garantiza la seguridad de la información confidencial (pasaportes) y facilita el seguimiento de itinerarios complejos de larga duración.

Este enfoque coincide con lo establecido en el documento de Alcance, donde se señala la necesidad de capacitar a un equipo de usuarios clave en el flujo *Oportunidad a Cierre*, en la gestión de la ficha del cliente y en el uso de actividades, como condición indispensable para que los módulos de CRM y Proyectos sean utilizados de manera correcta y sostenible en el tiempo.

9.2. Metodología de transferencia de conocimientos

El plan de capacitación se estructura en tres etapas fundamentales para asegurar la sostenibilidad del proyecto:

- a. **Capacitación operativa (CRM):** entrenamiento en el flujo integral de *Oportunidad a Cierre*, incluyendo el registro sistemático de pasajeros, la carga segura de documentos de identidad en el repositorio estándar y la gestión de notas para mantener una visión 360° del turista extranjero.
- b. **Gestión de reservas e itinerarios (Proyectos):** instrucción en el uso del tablero Kanban para el control de servicios (de 2 a 20 días), carga de vouchers de hoteles y boletos de tren, y el registro manual de adelantos para el control de saldos antes de compras no reembolsables.
- c. **Gestión de actividades y seguimiento:** taller práctico sobre el uso de alertas y recordatorios para llamadas y correos de fidelización, permitiendo una atención personalizada post-viaje.

Para reforzar el aprendizaje, se entregarán videos tutoriales operativos como material de consulta permanente.

9.3. Despliegue y retroalimentación

El cronograma de capacitación (3 semanas) se integra con las fases finales de configuración de Odoo. Esto permite realizar sesiones de retroalimentación con la gerencia para ajustar las etapas del embudo de ventas y las vistas de calendario antes de la puesta en marcha definitiva, validando que el sistema se adapte al flujo real de atención de clientes internacionales.

9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica

Dado que la etapa de capacitación se encuentra en curso o recién concluida, los resultados concretos de la adopción aún no pueden cuantificarse. Se espera que, una vez consolidado el uso del sistema por parte del personal, se observe una mejora gradual en la centralización de la información, el uso del CRM para el seguimiento de clientes y el control de reservas, así como una mayor adherencia a los protocolos de seguridad de la información. La evaluación de estos aspectos se realizará en la fase de monitoreo y ajustes posteriores.

10. Conclusiones

10.1. Sostenibilidad y escalabilidad del proyecto

La implementación del ecosistema Odoo establece una hoja de ruta sólida que permite a Machu Picchu Exclusive Tours E.I.R.L. evolucionar desde una gestión manual y fragmentada hacia un modelo digital inteligente. Al centralizar la data operativa en la nube, la empresa cuenta ahora con una infraestructura digital robusta y escalable, capaz de manejar un volumen creciente de pasajeros en itinerarios complejos (de 2 a 20 días) sin incrementar la carga operativa de la gerencia. Esta transición no solo elimina la duplicidad de tareas, sino que profesionaliza la atención al cliente y facilita la futura expansión hacia nuevos mercados y socios internacionales.

10.2. Mejora en la eficiencia y competitividad

De acuerdo con el Plan de Implementación, la digitalización del ciclo comercial y la adopción de un CRM integral sientan las bases para mejorar de manera significativa la eficiencia operativa y la competitividad de la empresa en los mercados internacionales. Los beneficios esperados incluyen reducciones sustantivas en los tiempos de respuesta, disminución de errores administrativos asociados a la gestión manual y un aumento progresivo en la captación y fidelización de clientes a través de canales digitales directos. Estas mejoras se proyectan como metas de mediano plazo y deberán ser verificadas durante la fase de monitoreo y evaluación del proyecto, utilizando los indicadores definidos (ventas digitales, tiempos de respuesta, recurrencia de clientes y reducción de errores), tal como se describe en el Plan.

10.3. Fortalecimiento de la seguridad y reputación digital

La implementación del repositorio estándar de Odoo para la gestión de documentos de identidad y pasaportes permite avanzar hacia un manejo más seguro de la información confidencial de los turistas. Al sustituir progresivamente el envío y almacenamiento volátil en dispositivos personales por un esquema centralizado y controlado, la empresa reduce los riesgos de pérdida o filtración de datos y fortalece las condiciones para consolidar una reputación digital sólida ante el mercado de lujo internacional.

10.4. Trazabilidad y control operativo integral

La integración de los módulos de CRM y Proyectos permite una visión 360° del turista, conectando el proceso de venta con la ejecución del servicio. El sistema garantiza la

trazabilidad total de los itinerarios, permitiendo un control riguroso de los saldos pendientes y la carga de documentos operativos (vouchers y boletos). Este orden logístico es fundamental para asegurar el éxito de los tours y evitar errores en la compra de servicios no reembolsables, garantizando una operación profesional y confiable.

11. Recomendaciones

11.1. Disciplina en el registro de información

Para garantizar que el sistema mantenga su valor estratégico, es fundamental que la carga de los documentos de identidad (pasaportes) y la actualización de los estados de pago se realicen en tiempo real. La fiabilidad de los reportes de Odoo depende directamente de que no existan procesos operativos fuera de la plataforma.

En línea con el Plan de Implementación, se recomienda que toda la gestión comercial y operativa vinculada a clientes, reservas y pagos se concentre en el CRM y en los módulos asociados, evitando registros paralelos en hojas de cálculo o canales informales. Solo así los indicadores definidos (ventas digitales, tiempos de respuesta, recurrencia, etc.) reflejarán con precisión la realidad del negocio.

11.2. Certificación en protección de datos y ciberseguridad

Dado que la empresa ahora centraliza información sensible de ciudadanos extranjeros, se sugiere establecer políticas formales de seguridad informática. Esto incluye la auditoría periódica de roles de usuario y el aprovechamiento de los respaldos automáticos en la nube para garantizar que los datos de los pasajeros estén protegidos bajo estándares internacionales de privacidad.

11.3. Escalabilidad hacia la gestión financiera

Tras la estabilización de los módulos de CRM y Proyectos, la empresa debería considerar la activación de los módulos de contabilidad financiera y gestión de comisiones. Esto permitiría automatizar los reportes de rentabilidad neta por tour y facilitar el cálculo de pagos a guías y personal de apoyo de forma integrada.

11.4. Implementación de analítica predictiva e IA

Se recomienda el uso futuro de tableros de control avanzados que permitan proyectar la demanda turística según la temporada y la nacionalidad. Asimismo, la integración de herramientas de inteligencia artificial para el marketing automatizado permitiría enviar recordatorios personalizados o promociones de fidelización a antiguos pasajeros de forma masiva pero segmentada, potenciando el valor de la base de datos histórica generada.

Indicador (KPI)	Línea base (manual)	Meta esperada (Odoo)	Impacto es- pe- ra- do
Tiempo de respuesta al cliente	2-4 horas (promedio)	< 1 hora	Reducción es- ti- ma- da de - 50 % a - 70 %
Conversión de cotizaciones	Sin registro sistemático	+15 % a +20 %	Incremento pro- yec- ta- do en ven- tas
Seguridad de pasaportes	0 % (almacenamiento volátil)	100 % (cifrado en la nube)	Mitigación de ries- gos de pér- di- da o fil- tra- ción de da- tos
Visibilidad de saldos	Consulta manual en Excel	Acceso en tiempo real	Mejora es- pe- ra- da en el con- trol in- terno
